


ROTEX

a member of **DAIKIN** group

ROTEX HPSU/HPU Certificat d'installation et d'instruction

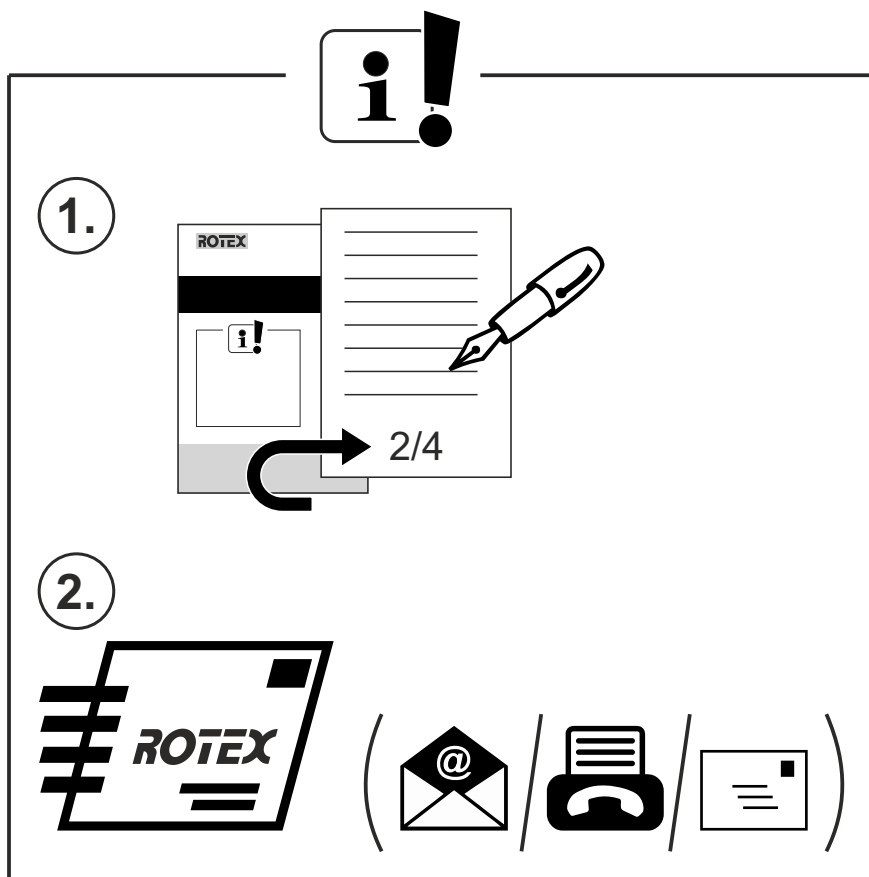

Certificat d'installation
et d'instruction
ROTEX HPSU/HPU

Français



Représenté en Belgique par:

Daikin Belux - Wavre
Avenue Franklin 1B
1300 Wavre
Tél. +32 (0)10 23 72 23
Fax +32 (0)10 24 49 10
e-mail info@daikin.be

Sales office Daikin Belux - Gent
Tél. +32 (0)9 244 66 44

Sales office Daikin Belux - Herentals
Tél. +32 (0)14 28 23 30

Représenté en France par:

Daikin Airconditioning France SAS
ZA du Petit Nanterre
31, rue des Hautes Pâtures
Le Narval - Bâtiment B
92737 Nanterre Cedex
Tél. +33 1 46 69 95 69
Fax +33 1 47 21 41 60
www.daikin.fr

Données unité ext. ROTEX HPSU/HPU (plaque signalétique*)

Modèle/type _____ N° de fabrication _____

(sous le logo ROTEX)

(N° MFG)

Données unité int. ¹⁾**ROTEX HPSU (compact) / HPU (plaque signalétique*)**

Modèle/type _____ N° de fabrication _____

(sous le logo ROTEX)

(N° MFG)

Acheteur

Nom _____

Adresse _____

Code postal _____ Ville _____

Téléphone _____

L'utilisation de l'appareil m'a été expliquée. Le manuel d'utilisation et le manuel de l'exploitant m'ont été remis.

Signature du client

ROTEX recommande, pour la sécurité d'exploitation de votre installation de chauffage, de conclure un contrat de maintenance et de faire indiquer dans le manuel d'utilisation les travaux d'entretien et les valeurs des mesures effectuées.**Veuillez indiquer dans les tableaux ci-après la situation de l'installation et les valeurs de réglage.****Société installatrice**

Nom _____

Adresse _____

Code postal _____ Ville _____

Téléphone _____

L'appareil mentionné a été installé par nos soins le _____ et a été remis au client.

Cachet et signature de la société installatrice

Société procédant à la mise en service

Nom _____

Adresse _____

Code postal _____ Ville _____

Téléphone _____

L'appareil mentionné a été mis en service par nos soins le _____ et a été remis au client.

Cachet et signature de la société chargée de la mise en service

Type d'installation chauffage uniquement chauffage et refroidissement ³⁾ préparation d'eau chaude**Circuit frigorifique**Unité extérieure plus haut plus bas qu'appareil int.

Différence hauteur unité int./ext. _____ m

Longueur conduites unité int./ext. _____ m

Nbre siphons récup. huile _____ pièces

Brasé sous azote oui nonConduites calorifugées oui nonContrôle d'étanchéité oui non

Pression de contrôle _____ bar

Durée de contrôle _____ h

Fluide de contrôle _____

Temps de tirage au vide _____ h

Qté rempl. fluide frigorigène R410A _____ kg (total)

Quantité de remplissage sur l'étiquette oui non**Installation de l'unité extérieure**Protection contre le vent disponible oui nonUnité extérieure >30 cm au-dessus du sol oui nonL'eau de condensation peut s'écouler librement oui nonUnité extérieure montée horizontalement oui nonPlots anti-vibratiles montés oui non**Montage unité intérieure**Bac de récup. condensats installé (pour chauffage + refroidissement) ¹⁾²⁾³⁾ oui nonÉcoulement des condensats disponible ¹⁾³⁾ oui nonChauffage électrique d'appoint purgé oui nonRégulation réglée oui nonRégulation paramétrée oui non

(*Compléter la fiche annexe !)

Taille de la pièce ¹⁾⁴⁾ _____ m³**Autres composants**Thermostat ambiant (câble) oui nonThermostat sans fil oui nonRégulateur d'ambiance RoCon U1 oui nonROTEX Solaris installé oui non

(*Remplir la feuille supplémentaire !)

Sol-Pac installé oui nonVanne de décharge montée ²⁾ oui nonBooster-Heater installé ²⁾ oui nonBackup-Heater installé oui nonLimiteur de température de retour (RLB) monté ²⁾³⁾⁸⁾ oui non**Documentation**Validation de la mesure de la sécurité électrique ⁵⁾ oui nonRemise de la documentation à l'exploitant ⁶⁾ oui nonFormation de l'exploitant/du personnel ⁷⁾ oui non**Autres remarques**

Emplacement voir notice d'installation

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾⁸⁾ Explications, voir verso.



ROTEX Heating Systems GmbH accepte

vis-à-vis du client final la garantie des erreurs de matériel et de fabrication selon les dispositions de la garantie (voir verso). Les droits à la garantie sont applicables uniquement si l'appareil a été installé et mis en service par une entreprise spécialisée et que ce formulaire dûment rempli a été renvoyé au partenaire commercial mentionné ci-dessous.

Veuillez vous le faire confirmer par écrit, par votre société d'installation sur ce certificat de mise en route.

ROTEX recommande, pour l'entretien et la maintenance régulières de l'appareil, de conclure un contrat de maintenance et de faire indiquer dans le manuel d'utilisation les travaux d'entretien et les valeurs des mesures effectuées.

Explications

- 1) Ne s'applique pas au HPSU monobloc compact
- 2) Ne s'applique pas au HPSU compact et au HPSU/HPU ^{hitemp}
- 3) Ne s'applique pas au HPSU/HPU ^{hitemp}
- 4) La pièce dans laquelle est installée l'unité intérieure doit avoir un volume minimal.
Celui-ci peut être calculé avec la formule suivante : volume de la pièce min. en m³ = quantité totale de R410A en kg / 0,3 kg/m³
- 5) Lors de la mise en service du raccord électrique, une mesure de la sécurité électrique est nécessaire.
Celle-ci doit être réalisée et certifiée par un professionnel qualifié.
- 6) La documentation se compose :
 - du manuel d'utilisation / du manuel de fonctionnement
 - Manuel d'utilisation
- 7) L'exploitant a été informé de son devoir de documentation relatif à la maintenance annuelle de l'installation et à l'attestation relative aux quantités de remplissage de fluide frigorigène selon le règlement européen 842/2006 (CE) relatif aux gaz fluorés.
- 8) Uniquement nécessaire pour les applications solaires ou les installations bivalentes.

Dispositions de la garantie

D'une manière générale, les conditions de garantie en vigueur s'appliquent. La garantie fabricant annexe peut être consultée sur notre site internet: www.rotex.fr > « Garantie » (avec la fonction de recherche)

Clause de protection des données

Tous les signataires et destinataires de ce formulaire s'engagent à ne pas transmettre les données personnelles qui y sont indiquées à un tiers sans un accord express.

Copie

| | | |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Original: | --> ROTEX | <input type="checkbox"/> |
| 1 ^{er} copie: | --> Client | <input type="checkbox"/> |
| 2 ^{ème} copie: | --> Société installatrice | <input type="checkbox"/> |



a member of **DAIKIN** group

www.rotex-heating.com
